

OBRA: REDEFINICIÓN DE LA CIRCULACIÓN EN LA RAMBLA PORTUARIA

CRONOGRAMA DE CORTES EN LA RAMBLA PORTUARIA DE MONTEVIDEO

A continuación se presenta el cronograma de cortes parciales y totales previstos para la ejecución de las obras de referencia.

11/06/19 al 05/07/19

Cateos Rambla portuaria (cada 50 m) en senda salida a Montevideo del lado del cantero (Desde AFE hasta Colombia)

Los cateos comenzaron el día 11-06-2019 y se extenderán hasta el 05-07-2019

Se realizaron cada 40 metros u 80 metros, la zona afectada es la senda contra el cantero central de la vía que va desde Ciudad Vieja a los accesos de Montevideo.

La zona afectada es una zona móvil de aproximadamente 70 metros, comenzando en frente a AFE y finalizando en la calle Colombia..

La senda contra la vereda de AFE permanece libre de circulación.



08/07/19 al 12/08/19

Cateos Rambla portuaria (cada 80 m) en senda salida a Montevideo del lado del cantero (Desde Colombia hasta San Fructuoso)


Los cateos comenzaron el día 08-07-2019 y se extenderán hasta el 12-08-2019

Se realizarán cada 80 m, en caso de ser necesario se realiza cateos puntuales en el resto de la traza, la zona afectada es la senda contra el cantero central de la vía que va desde Ciudad Vieja a los accesos de Montevideo.

La zona afectada es una zona móvil de aproximadamente 70 metros, comenzando en frente a Rowing y finalizando en la calle San Fructuoso.

La senda contra la ciudad permanece libre de circulación.

OBRA: REDEFINICIÓN DE LA CIRCULACIÓN EN LA RAMBLA PORTUARIA

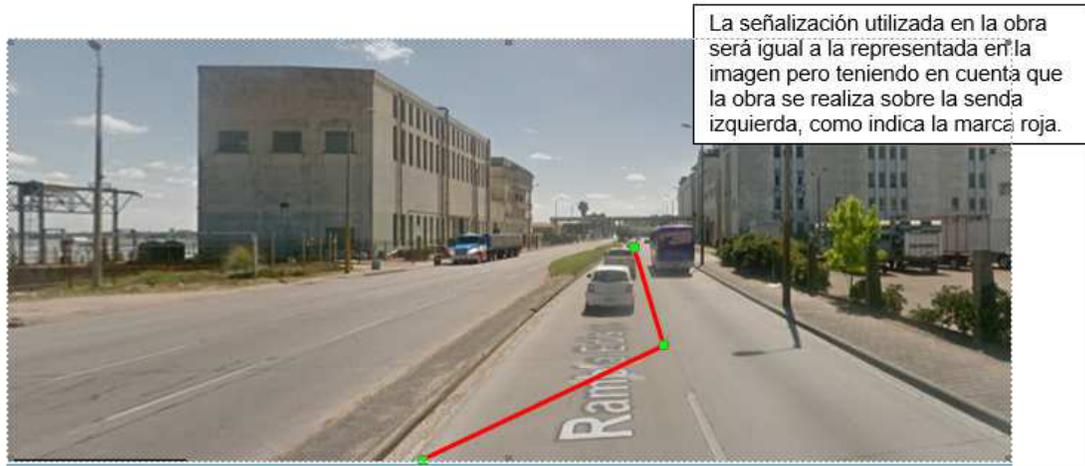

22/07/19 al 30/07/19

Escaneo con Georadar(se interfiere sólo una senda en misma afectación que los cateos)

Se realizará el escaneo con georadar de toda la superficie de la Rambla portuaria entre AFE y San Fructuoso, el procedimiento se realizará con equipamiento del tamaño de un carro de bebé cortando parcialmente una de las sendas, esta previsto que el trabajo se realice en las mismas condiciones que los cateos mencionados anteriormente, la duración de esta tarea será de una semana y comenzará el 22 de Julio de 2019.

19/08/19 al 13/09/19

Construcción de nuevas bocas de tormenta y demolición de las existentes.

Las obras comenzarán el 19-08-2019 y se extienden hasta el 13-09-2019



Se realizará la construcción de las nuevas bocas de tormenta y la demolición de las existentes en el sector desde AFE, hasta la calle Colombia.

La zona afectada es la senda contra la vereda de la vía que va desde Ciudad Vieja a los accesos de Montevideo.

Quedando la senda contra el cantero central, libre para la circulación en un ancho de 6mts permitiendo la circulación de 2 vehículos. Ver croquis a continuación.

OBRA: REDEFINICIÓN DE LA CIRCULACIÓN EN LA RAMBLA PORTUARIA RBLA. SUD AMERICA

Situación entre calle Guatemala y Colombia

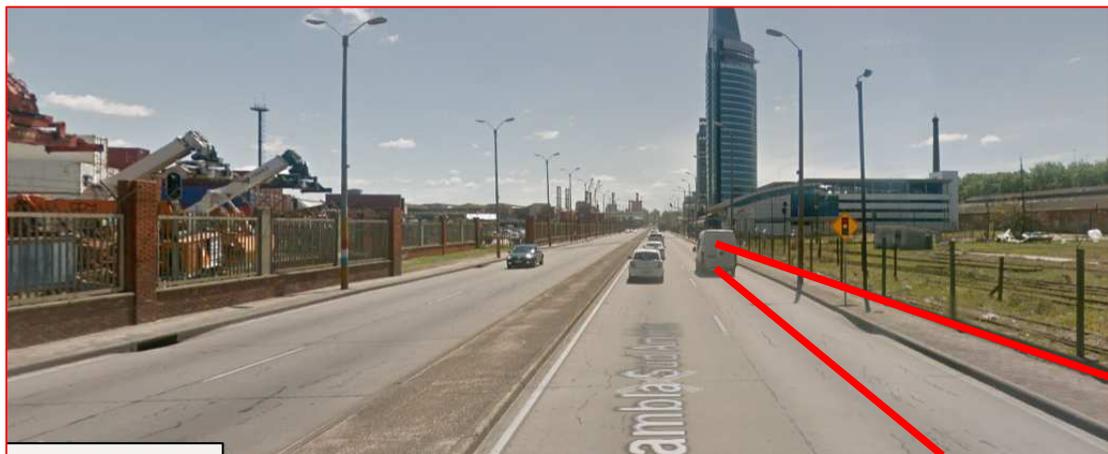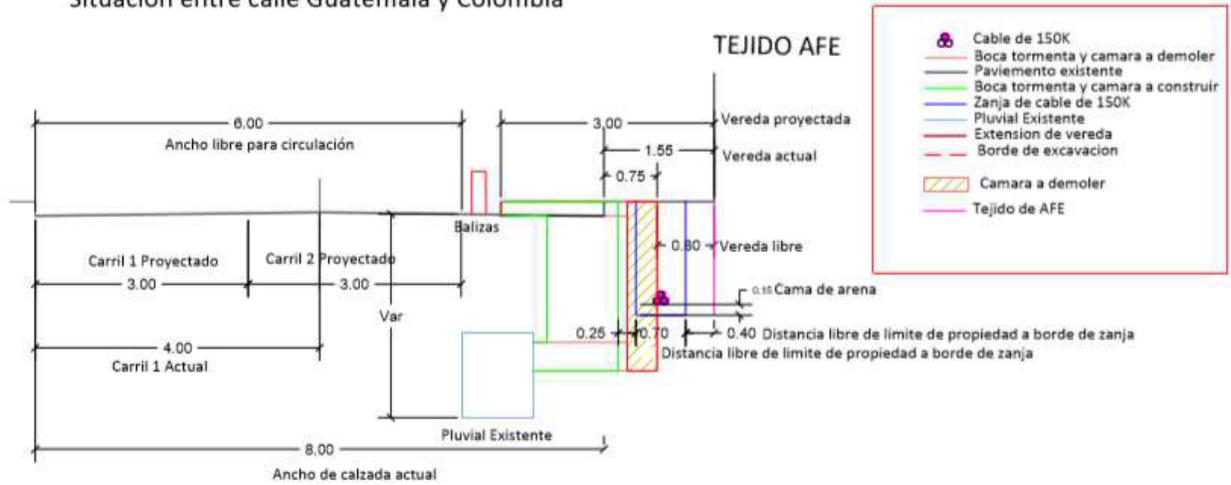

19/08/19 al 28/10/19


Excavación y colocación Cable de 150Kv

En simultáneo con la tarea del punto anterior se comenzarán las obras de excavación para el cable de 150kV. Desde el 19-08-2019 y se extienden hasta el 11-10-2019

Se realizará un nuevo tendido de línea de alta tensión, la Curva frente AFE hasta Pacheco y la Rambla.

La zona afectada es la senda contra la vereda de la vía que va desde Ciudad Vieja a los accesos de Montevideo.

Quedando la senda contra el cantero central, libre para la circulación en un ancho de 6mts permitiendo la circulación de 2 vehículos.

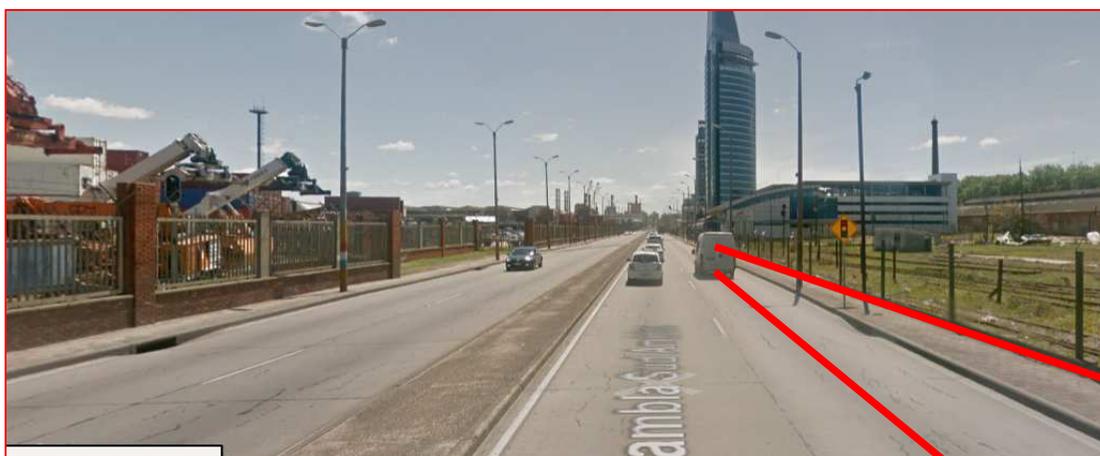

04/11/19 al 05/02/20

Corte total Rambla Portuaria Etapa 1

El corte de calle se realiza desde la estación de AFE hasta calle Colombia, permitiendo a todo el tránsito el giro a la derecha de calle Colombia.

Para los vehículos que vienen desde los accesos de Montevideo, éstos deberán desviarse en la calle San Fructuoso y realizar el recorrido propuesto en el plan de Desvíos de la Obra.

Los camiones que van al puerto, se les permitirá circular por Rambla hasta el ingreso por el acceso Norte actual(a la altura de Tajés).

VEHÍCULOS QUE ENTRAN A LA CIUDAD



En azul se muestra el recorrido de los vehículos de la ciudad, en amarillo se muestra el recorrido de ingreso de los camiones al puerto.

VEHÍCULOS QUE SALEN DE LA CIUDAD



En azul se muestra el recorrido de los vehículos de la ciudad, en celeste vía que no se cierra en esta etapa de obra.

06/02/20 al 10/05/21

Corte total Rambla Portuaria Etapa 2

El corte de calle se realiza desde la estación de AFE hasta calle San Fructuoso, en ambas carriles de las 2 sendas.

Todos los vehículos livianos y camiones que no ingresen al puerto, circularan por el desvío propuesto en el plan de Desvíos de Obra..

Los camiones que entran y salen del puerto, se les permitirá circular de forma temporal por el carril este de la Rambla, hasta el ingreso provisorio situado a la altura de Santa Fé.

La calzada oeste, se utilizará para la circulación interna de obra para el relleno de la bahía

VEHÍCULOS QUE ENTRAN A LA CIUDAD



En azul se muestra el recorrido de los vehículos de la ciudad, en amarillo el tramo de circulación(calzada este de la rambla) para ingreso de los camiones portuarios, en naranja la calzada de uso de Obra para el relleno de la bahía.

VEHÍCULOS QUE SALEN DE LA CIUDAD



En azul se muestra el recorrido de los vehículos de la ciudad.

11/05/20 al 05/07/21

Corte total Rambla Portuaria Etapa 3

El corte de calle se realiza desde la estación de AFE hasta calle San Fructuoso. Los vehículos de la ciudad circularán por los desvíos definidos en el Plan de Desvíos de Obra.

Los camiones que van al puerto ingresarán por el acceso norte provisorio generado a la altura de Entre Ríos.

Id	Modo de	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28		
						jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul		
1	↔	REDEFINICIÓN DE LA CIRCULACIÓN EN LA RAMBLA PORTUARIA	lun 01/04/19	lun 05/07/21	541 días																												
5	↔	Desvíos de Obra	mié 12/06/19	lun 05/07/21	495 días																												
6	↔	Cateos Rambla portuaria (cada 50 m) en senda salida a Montevideo del lado del cantero (Desde AFE hasta Colombia)	mié 12/06/19	vie 05/07/19	18 días																												
7	↔	Cateos Rambla portuaria (cada 80 m) en senda salida a Montevideo del lado del cantero (Desde colombia hasta San Fructuoso)	lun 08/07/19	mié 07/08/19	22 días																												
8	↔	Escaneo con Georadar(se interfiere sólo una senda en misma afectación que los cateos)	lun 22/07/19	mar 30/07/19	7 días																												
9	↔	Construcción de nuevas bocas de tormenta y demolición de las existentes	lun 19/08/19	vie 13/09/19	20 días																												
10	↔	Excavación y colocación Cable de 150Kv	lun 19/08/19	vie 11/10/19	40 días																												
11	↔	Corte total Rambla Portuaria Etapa 1	lun 04/11/19	mié 05/02/20	2,7 mss																												
12	↔	Corte total Rambla Portuaria Etapa 2	jue 06/02/20	lun 10/05/21	15 mss																												
13	↔	Corte total Rambla Portuaria Etapa 3	mar 11/05/21	lun 05/07/21	2 mss																												

Proyecto: C:\Users\gmartinez\Des Fecha: mar 23/07/19	Tarea		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Fecha límite	
	División		Tareas externas		Resumen inactivo		Resumen manual		Progreso	
	Hito		Hito externo		Tarea manual		Sólo el comienzo		Progreso manual	
	Resumen		Tarea inactiva		Sólo duración		Sólo fin			
